

池町川第二放水路（仮称）築造工事 令和5年6月号

浸水対策 5月の工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

池町川第二放水路関連工事




・発進立坑（アーバンリング工法）の築造作業を行っています。

5月は、2～6リング目の施工を行い、深さ7.5mまで完了しました。（全21リング、深さ：約25m）
 6月も継続して圧入・掘削、組立作業を行っていくため、大型ダンプによる掘削土砂の搬出を毎日行います。
 大型車両の出入りが発生しますが、引き続き、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど
 よろしくお願いたします。

発進立坑 進捗

5月末時点

完成時

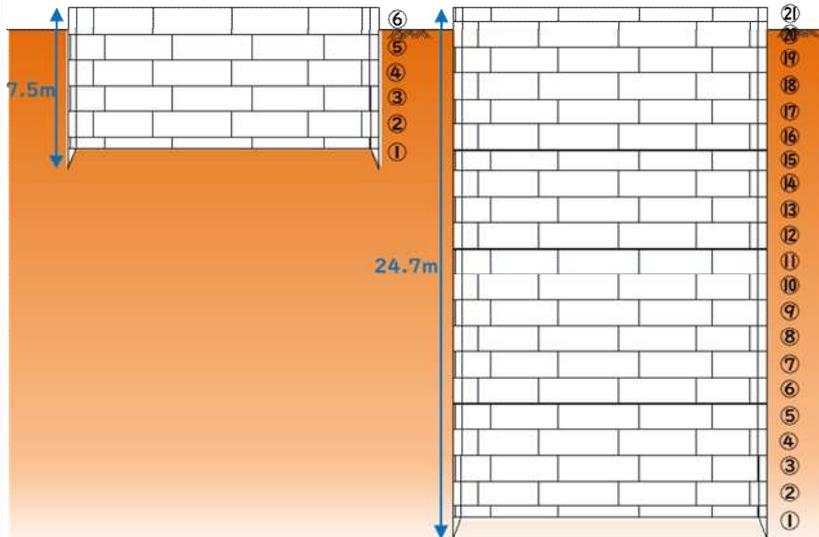

※掘削に伴う、周辺地盤への影響を防止するために立坑内に水を張って作業を行っています。



発進立坑築造状況



発進立坑内部 掘削状況

6月の工事予定内容

・掘削圧入作業及び鋼製リング組立作業を行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
掘削圧入工 リング組立工		発進基地				ダンプでの残土運搬を毎日行います。 (平均40台/日)

関連情報は
こちら

