

池町川第二放水路（仮称）築造工事 令和5年7月号

浸水対策 6月の工事状況おしらせ


発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

池町川第二放水路関連工事



・発進立坑（アーバンリング工法）の築造作業を行っています。
 6月は、7～17リング目の施工を行い、深さ20.5mまで完了しました。（全21リング、深さ：約25m）
 7月で全21リングの圧入・掘削、組立作業が完了する予定ですが、完了までの間、**大型ダンプによる掘削土砂の搬出を毎日行います。大型車両の出入りが発生しますが、引き続き、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。**

発進立坑 進捗

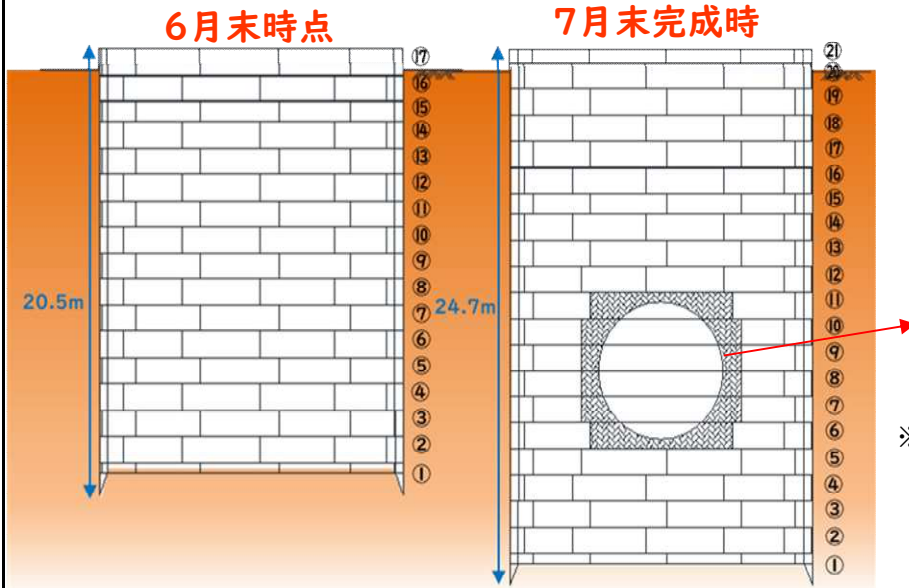

圧入掘削状況



FFUセグメント

※通常のセグメントには鋼製セグメントを使用しますが、シールド発進部ではFFUセグメント（合成木材）を使用することで、シールドマシンでの直接切削が可能となります。

7月の工事予定内容

- ・掘削圧入作業及び鋼製リング組立作業
- ・水中コンクリート打設、圧入装置撤去作業 を行います。

作業内容	工事場所	時期			備考
		上旬	中旬	下旬	
掘削圧入工 リング組立工	発進基地				ダンプでの残土運搬を毎日行います。 （平均40台/日）
水中コンクリート 圧入装置撤去工	発進基地				7/22(土)はコンクリート打設のため ミキサー車が約180台出入りします。

関連情報は
こちら

