


池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和6年6月号

浸水対策

工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

池町川第二放水路関連工事

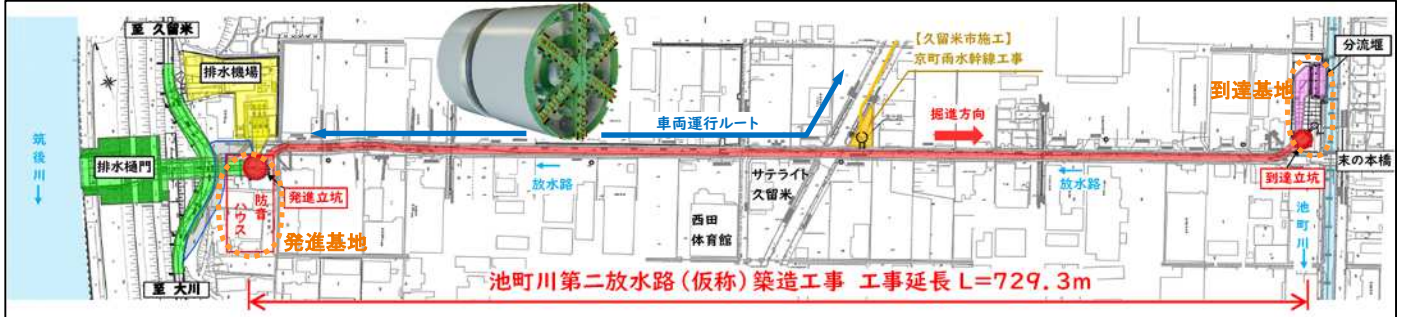

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



5月の工事進捗

- 【発進基地】シールド機発進に向けた準備工を行っています。
- 【到達基地】到達立坑築造工を行っています。



発進立坑内状況
(シールド機インストール後)



到達立坑
水中コンクリート打設状況



到達基地状況
(立坑築造状況)

6月の工事予定内容

- 【発進基地】6月中旬からシールド機による掘進を開始いたします。
- 【到達基地】シールド到達部の地盤改良工を行います。

工事箇所	作業内容	時期	6月			備考
			上旬	中旬	下旬	
発進基地	シールド 発進準備工					
	シールド 掘進工					
到達基地	地盤改良工					一部、道路上での作業が発生いたします

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年1月	4月	7月	10月	令和7年1月
	発進立坑築造				到達立坑築造			
		シールドマシン・防音ハウス組立			シールド掘進工			撤去工
