


池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和6年9月号


浸水対策

工事状況おしらせ

池町川第二放水路関連工事



発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

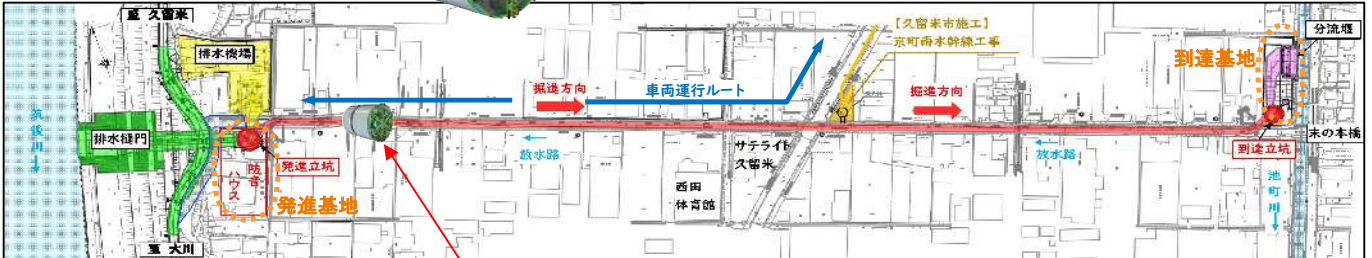

シールド機位置
8/22時点

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



8月の工事進捗

【発進基地】シールド機による掘進、段取替えを行いました。



発進立坑内状況



防音ハウス内状況



坑内状況
(96m掘進時点 全702m)

9月の工事予定内容

【発進基地】引き続き、シールド機による掘進を行います。

工事箇所	作業内容	時期	9月			備考
			月上旬	中旬	下旬	
発進基地	シールド掘進工					風間には土砂搬出車両が出入りすることがあります

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年1月	4月	7月	10月	令和7年1月
	発進立坑築造			到達立坑築造				
			シールドマシン・防音ハウス組立		シールド掘進工		撤去工	
