


池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和6年 11・12月号


浸水対策

工事状況おしらせ

池町川第二放水路関連工事



発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

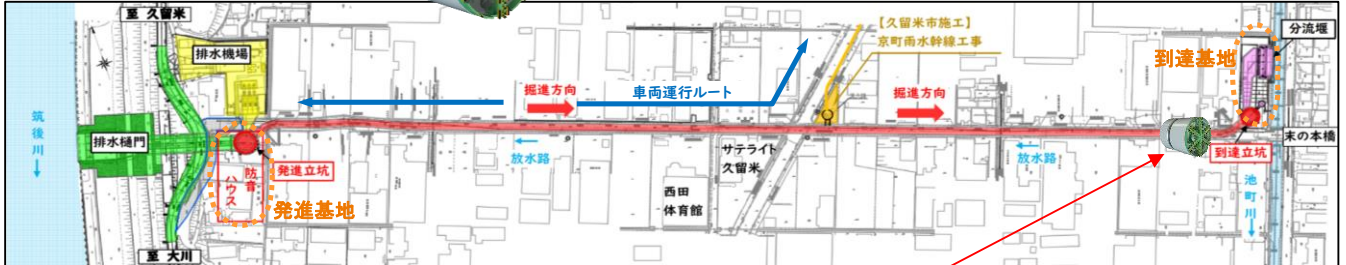

シールド機位置
11/8時点 682m

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。



11月の工事進捗

- 【発進基地】シールド機による掘進を行いました。
- 【到達基地】到達準備工(坑口コンクリート打設、到達受台設置)を行いました。



坑内状況
(掘進完了箇所)



坑内状況
(682m掘進地点 全702m)



到達立坑内状況
(坑口コンクリート打設完了)

12月の工事予定内容

- 【発進基地】シールド機による掘進、坑内設備の撤去を行います。
- 【到達基地】シールド機解体を行います。

工事箇所	作業内容	時期	12月			備考
			上旬	中旬	下旬	
発進基地	シールド掘進工					屋間には土砂搬出車両が出入りすることがあります
	坑内設備撤去工					
到達基地	シールド機解体工					

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年 1月	4月	7月	10月	令和7年 1月
	発進立坑築造			到達立坑築造				
	シールドマシ・防音ハウス組立			シールド掘進工				
				撤去工				
