

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事

令和5年9月号

浸水対策 8月の工事状況おしらせ

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事

✿ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

👷 受注者：(1工区)大豊・濱崎特定JV (2工区)フジタ・永幸特定JV



・地盤改良工事を行いました。


池町川が増水した際に、川の水を引き込む地下調節池（プール）を作る工事を行っています。

8月までに、地盤改良（調節池を支える地盤を固める）工事を行い、現在はその工事が完了しています。


9月からは施工業者が変わり、仮設工の支柱（鋼材）を地中に入れる工事に着手します。

大型車両(資材搬入者(トレーラー)、ダンプトラック、ポンプ車等)の出入りが発生しますが、地域の安全確保に努めて参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。(最大10台/日)

築造工事 進捗

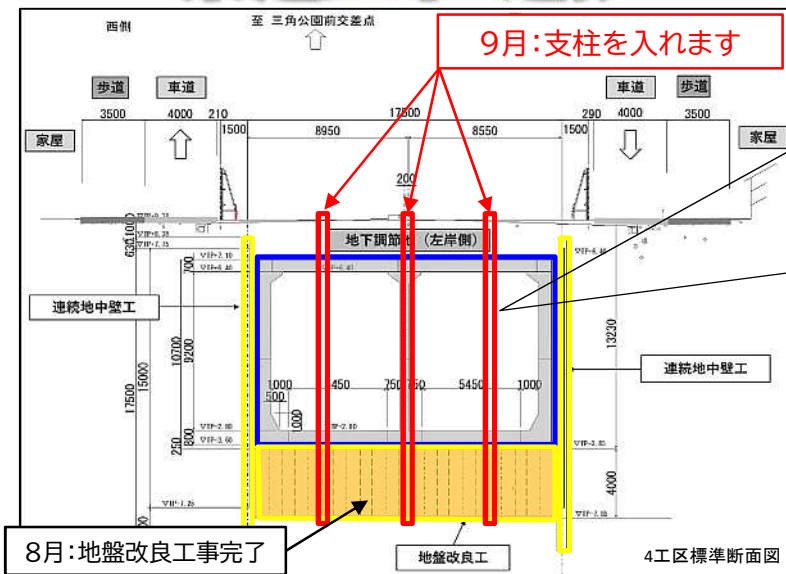

この支柱は地上で作業をするための覆工板を支える柱です。

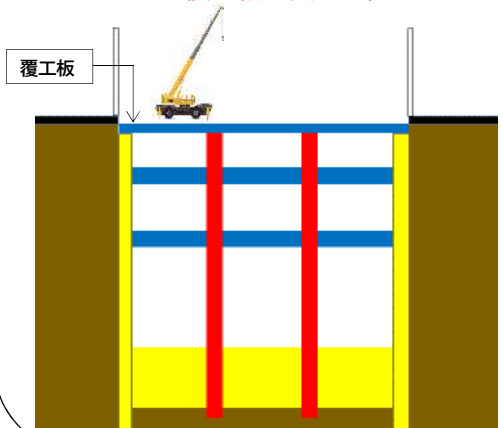

🟡 施工済 🟠 施工中

9月の工事予定内容

・施工業者が変わります。

1工区 → 3工区：大豊・森本・濱崎特定JV

2工区 → 4工区：鴻池・新井・九州環境特定JV

・仮設工の支柱（鋼材）を地中に入れる工事を行います。

| 作業内容 | 時期 | 工事場所 | 時期 | | | 備考 |
|----------------------|----|-------|----|----|----|----------------------------|
| | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| 仮設工 (支柱を地中に入れる工事) | | 地下調節池 | | | | 大型車の出入りがあります。 (最大10台/日) |

関連情報は
こちら

