

池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和6年7月号


浸水対策

工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所

受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

池町川第二放水路関連工事

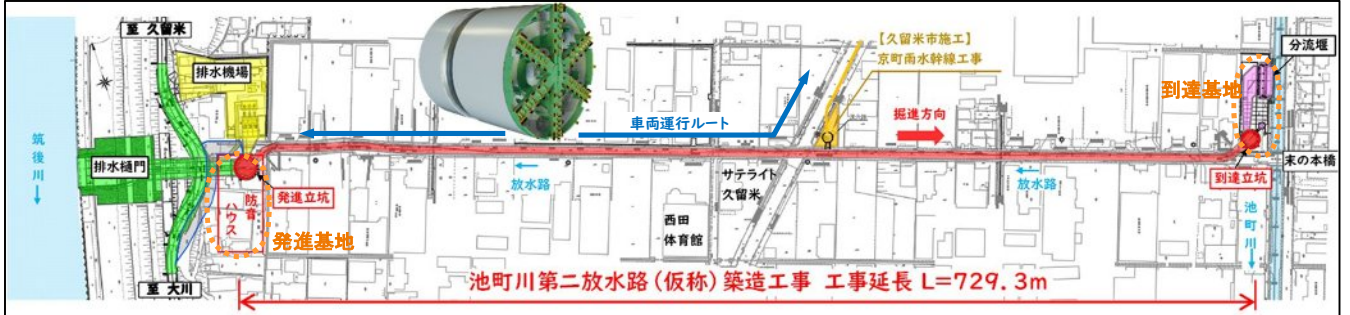

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。



6月の工事進捗

- 【発進基地】シールド機が発進いたしました。
- 【到達基地】シールド到達部の地盤改良工を行いました。



鋼製セグメント



坑内状況
(8m掘進時点 全702m)



到達基地状況
(シールド到達部地盤改良状況)

7月の工事予定内容

【発進基地】引き続き、シールド機による掘進を行います。

工事箇所	作業内容	7月			備考
		上旬	中旬	下旬	
発進基地	シールド掘進工 (初期掘進)	■	■		昼間には土砂搬出車両が 出入りすることがあります
	段取替工		■	■	

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年 1月	4月	7月	10月	令和7年 1月
	発進立坑築造			到達立坑築造				
	シールドマシ・防音ハウス組立			シールド掘進工				
					撤去工			
