


池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和7年2月号


浸水対策

工事状況おしらせ

池町川第二放水路関連工事



発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

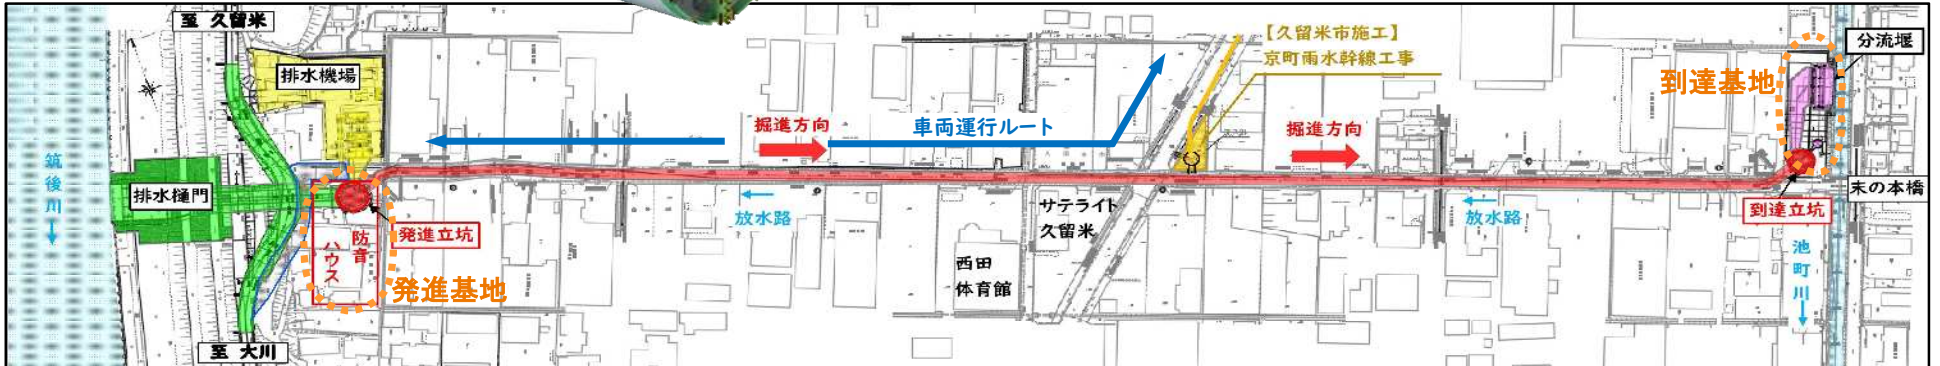

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。




1月の工事進捗

- 【発進基地】仮設備撤去工、急曲線被覆工を行いました。
- 【到達基地】シールド機解体工を行いました。



坑内状況

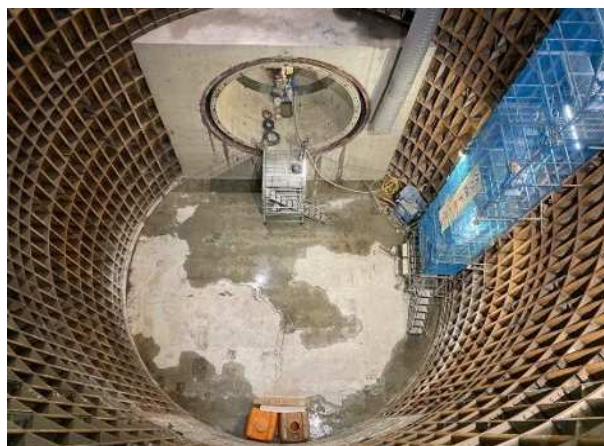

発進立坑内状況



到達立坑内状況
(シールド機解体状況)

2月の工事予定内容

- 【発進基地】防音ハウス解体工を行います。
- 【到達基地】シールド機解体工、仮設備撤去工、急曲線被覆工を行います。

工事箇所	作業内容	時期			備考
		2月上旬	2月中旬	2月下旬	
発進基地	防音ハウス解体工	■	■	■	
到達基地	シールド機解体工	■			
	仮設備撤去工		■		
	急曲線被覆工			■	

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年1月	4月	7月	10月	令和7年1月
	発進立坑築造			到達立坑築造				
				シールドマシン・防音ハウス組立		シールド掘進工		撤去工
