福岡県
FukuokaPrefecture
≪県土整備部≫

黒川筋河川災害関連事業

令和6年
9月末現在

・事業箇所位置図

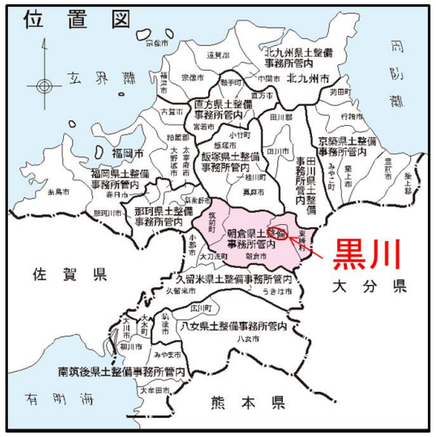

・雨の状況

■ハイエトグラフより、佐田川(黒川・疣目川上流付)付近では、
1時間雨量で90mm以上、24時間雨量で400mm以上の降雨となった。
■この異常な自然現象による当該河川の被災は、現地において**護岸崩壊**
護岸背面の流出など激甚な豪雨災害であった。

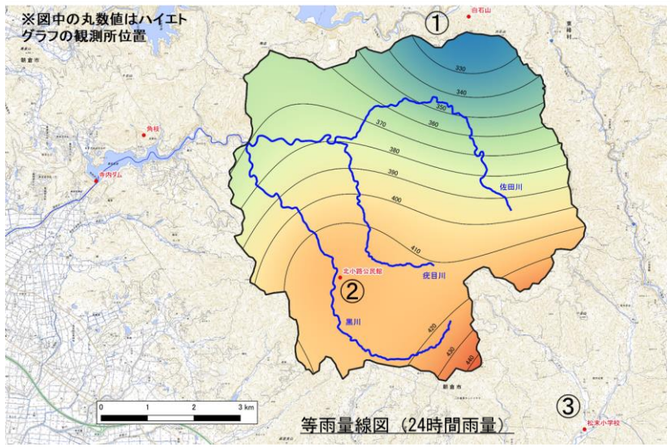

等雨量線図（24時間雨量）



観測所雨量ハイエトグラフ （R05.7.10出水）

・事業概要工程表

【黒川】

作業項目	詳細	R5年度												R6年度												R7年度												R8年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
改良復旧事業検討	概略設計																																															
河道(護岸)設計	詳細設計																																															
頭首工・落差工設計	詳細設計																																															
用地・物件調査	測量・調査																																															
用地取得																																																
河川災害関連工事																																															

・被災状況

・整備イメージ

《効果》
・災害原因である河状不良箇所である屈曲を是正
・河道拡幅によりR5被災流量に対し、護岸溢水を防止

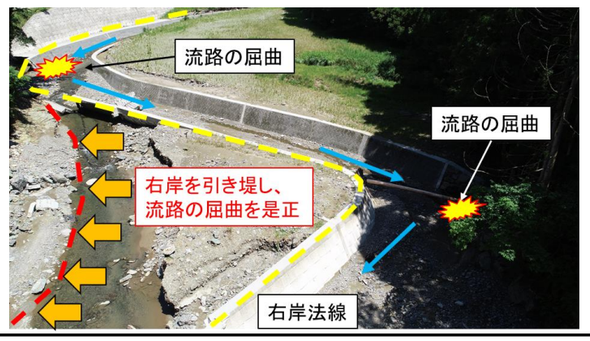

・事業の進捗状況
